ARQUITECTURA E INGENIERIA BELAR S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL

DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, MORI

NUMEROS GENERADORES

DATOS GENERALES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO MR40 EN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE.	FECHA:	15-may-23
UBICACION:	CALLE EMILIANO ZAPATA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	No. DE ESTIMACION :	3 (TRES Y FINIQUITO)
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA E INGENIERIA BELAR S.A. DE C.V.	PERIODO DE EJECUCION:	05/06/2023 10/06/2023
CONTRATO N: JOLEVA/OP/FIRM/01/2023	03-may-23		

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION CAD	CAD	Largo	Ancho1	Ancho2	Prom	Espesor	TOTAL	UNIDAD
7	PAVIMENTO DE CONCRETO MR- 40 T.M.A. 1 ½ REVENIMIENTO 10 ± 2.5 PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR RESISTENCIA PARA PASO VEHICULAR A 3 DIAS, DE 40 kg / cm²,CPC 40 RS (Cemento Portland Compuesto Clase 40 RS) A TIRO DIRECTO/BOMBEABLE,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA-PASAJUNTAS A CADA 3.00 M., ACABADO RAYADO FINO, INCLUYE: PASAJUNTAS CIMBRADO EN CASO DE SER NECESARIO ,MATERIALES, FIBRA DE POLIPROPILENO, CIMBRADO, COLADO VIBRADO, CURADO PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA									
		0+330	0+340	2.31	7.69	7.67	7.68		17.71	M2
		0+340	0+350	10.00	7.55	7.56	7.56		75.55	M2
		0+350	0+360	10.00	7.56	7.62	7.59		75.90	M2
		0+360	0+370	10.00	7.62	7.52	7.57		75.70	M2
		0+370	0+380	10.00	7.52	7.30	7.41		74.10	M2
		0+380	0+390	10.00	7.30	7.27	7.29		72.85	M2
		0+390	0+400	10.00	7.27	7.29	7.28		72.80	M2
		0+400	0+410	10.00	7.29	7.01	7.15		71.50	M2
		0+410	0+420	10.00	7.01	6.98	7.00		69.95	M2
		0+420	0+430	10.00	6.98	6.99	6.99		69.85	M2
		0+430	0+440	10.00	6.99	8.12	7.56		75.55	M2
		0+440	0+450	10.00	8.12	10.34	9.23		92.32	M2
								TOTAL	843.78	M2
								PARA ESTA ESTIMACION	843.7800	M2

CROQUIS

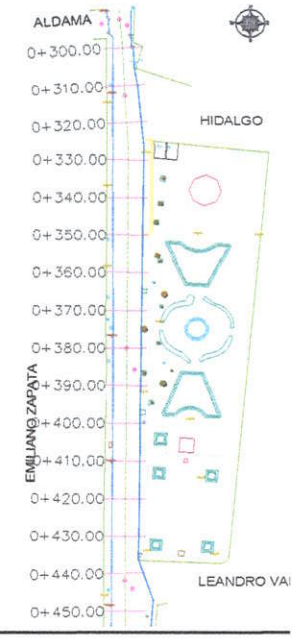

Vo. Bo.:	SUPERVISOR	RESIDENTE DE OBRA
ARQ. JORGE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	ING. JOSUE NAJERA RIVERA	ING. ABRAHAM BELTRAN LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRAS	REPRESENTANTE LEGAL, ARQUITECTURA E INGENIERIA BELAR S.A. DE
